

PIONEERS IN  
**FIBER**  
REINFORCED  
CONCRETE

# STEEL FIBER



# APPROVALS & TESTS

STEEL FIBER  
APPROVALS  
& TESTS

PIONEERS IN  
**FIBER**  
REINFORCED  
CONCRETE

# STEEL FIBER APPROVALS

مشروع معارض ومستودعات العجلان - طيبة

طلب اقتراح عينة

رقم الطلب: AJ-MAT-03-046-req.1  
تاريخ الطلب: 4-Dec-24

رقم الطلب: AJ-MAT-03-046  
تاريخ الطلب: 4-Dec-24

التخصص:  معارض  مخازن  مباني  غيرها

المواد:  حديد  خرسانة  خرشوف  خرشوفات  خرشوفات

رقم الاصل	المراد	المنتج / العنصر	وصف المادة	م
	المعلاق	المعلاق	steel Fibers (المعلاقين) EESF End Hooked 1.0/50 Hooked EESF Xorex corrugated segment 0.7/50 EESF APT round wavy 1.0/50	1

يطلب المعلاق من العنصر من العنصر الذي له متطلبات ومواصفات العنصر و هذا العنصر لا يدخل المعلاق من مواصفاته بحيث يكون له هذا الرقم من مواصفاته العنصر من مواصفاته العنصر مع المواصفات الفنية والهندسية الخاصة بالعنصر والمنتجات المعنونة والمطلوب على ما هو موضح في الجدول التالي.

مواصفات المعنونة: الاسم: محمد بن شويح  
التاريخ: 4-Dec-24

مواصفات المعنونة: الاسم: محمد بن شويح  
التاريخ: 4-Dec-24

تم اعتماد - لعينة EESF Xorex Corrugated segment 0.7/50 فقط  
على انه يتم عمل اقتراحات مدونة عليها

م	INFO	D	C	B	A	ملاحظة الاصل
						مواصفات المشروع: محمد بن شويح الاسم: محمد بن شويح التاريخ: 4-Dec-24
						مواصفات المشروع: محمد بن شويح الاسم: محمد بن شويح التاريخ: 4-Dec-24

**HAPTOWN**

**INFRACON**  
HAPTOWN PROJECT

**DOCUMENT SUBMITTAL SHEET (DOS)**

Contract Ref: HPT02514		Ref: INFRACON-HAP-AACE-HPT02S14-DOS-CIVIL-0008		Rev.00	
To: AACE Eng. Akram Ahmed		Cc: HAP		Submittal Issue Date: 29-9-2025	
Contractor Signature: Pr. Manager Eng. Ashraf Mousir				Response Requested By:	
Submittal Contents Description			Enclosure		Discipline:
Project: HAPTOWN Location: - Subject: Pre-qualification for Steel Fiber Reinforcement in Domestic Water Tank S.O.G (Egyptian European Steel Fiber)			<input type="checkbox"/> Drawing <input checked="" type="checkbox"/> Literature <input type="checkbox"/> Calculation <input type="checkbox"/> Specification <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> INFRA		<input checked="" type="checkbox"/> Civil <input type="checkbox"/> Arch <input type="checkbox"/> Mech <input type="checkbox"/> Elec <input type="checkbox"/> Planting <input type="checkbox"/> Irrigation <input type="checkbox"/> General
Item	Document Ref. No.	Rev.	Date	Title	Status
1		0	29-9-2025	Pre-qualification for Steel Fiber Reinforcement in Domestic Water Tank S.O.G (Egyptian European Steel Fiber)	B
COMMENTS: <i>*Refer to our comments inside the attached.</i>					
Consultant / Engineer's Representative		Returned To Contractor: Document Status			
Date Received: 1-10-2025		(A): Approved		(C): Rejected, Revise and Resubmit	
Signature:		(B): APPROVED AS NOTED, WORK MAY PROCEED - INCORPORATE COMMENT		(D): REJECTED	
DISTRIBUTION: From Consultant To:		Resident Engineer			
- Contractor		Signature:			
- Cc. Client		Date: .....			
		AACE Received	INFRACON Received	HAP Received	



## Arabia for Design and Engineering Consulting

العربية للتصميمات والاستشارات الهندسية

Dr. Eng. Ayman Hussein Hosny Khalil

أ.د. / أيمن حسين حسنى خليل

9-9-2024

**ATTENTION: EGYPTIAN EUROPEAN STEEL FIBER COMPANY**


**RE: SLAB ON GROUND-WAREHOUSE OF THIRD SETTLEMENT**

**Dears:**

Please accept this letter as an approval of the submitted design for the slab on grade for the warehouse for ELARABY Group in the Third Settlement, New Cairo. We have verified the design through independent modeling. The following was use as the design review data: a) live load of 20 kN per square meter, b) Modulus of sub grade reaction of 700 ton per cubic meter, c) maximum spacing between expansion joints is 29000 mm, and d) minimum tensile resistance of the 25 kg steel fiber concrete is 56 kG/cm<sup>2</sup>.

The following should be noted during execution:

- 1- Use of at least one layer of 300-micron plastic sheet between the subgrade and the slab. Using two layers is preferable to reduce possible restraint to slab movement.
- 2- The surface of the subgrade should be leveled with maximum variation in level of +/- 5 mm in 6000 mm intervals.
- 3- Expansion joint width is 20 mms.
- 4- Openings at columns and similar should be provided reinforcement as shown in the below sketch.

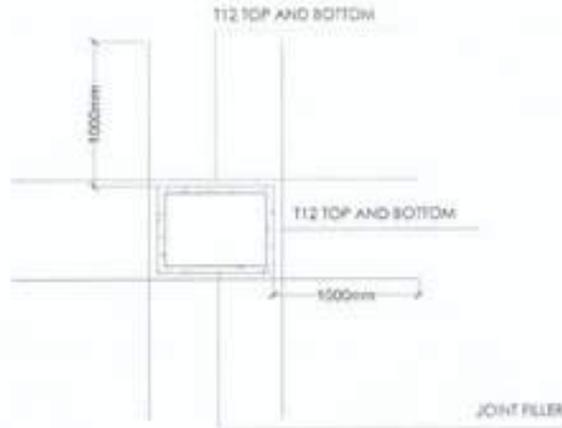

TYPICAL SOG DETAIL AT COLUMNS, WALLS AND OPENINGS

Very truly yours,

Arabia for Design and Engineering Consulting, P.C.

Ayman Hussein Hosny Khalil

HEAD OF STRUCTURAL ENGINEERING DIVISION

AIN SHAMS UNIVERSITY

  
**Arabia**  
For Design And Engineering Consulting  
**ADEC**  
Prof. Dr. Ayman Hussein Hosny Khalil

42 Gahel El Din El Desouki St., Almaza, Heliopolis, Cairo, Egypt ٤٢ ش جلال الدين الدسوقي - المازة - مصر الجديدة - القاهرة

(+202) 2415 0255

تليفون ، ٢٤ ١٥٠٢٥٥ (+٢٠٢)

info@adec-arabia.com

WWW.EESF-FIBER.COM



**DOCUMENT SUBMITTAL (DOS)**

Project Name : SEEG Samsung Canopy Project Date : 14-12-2024  
 Employer : SAMSUNG Submittal No. : SAM-MGD-EGEC-DOC-ST-006-00  
 Project Manager : SAMSUNG Contract : SEEG Samsung  
 Consultant : EGECA To : EGECA  
 Contractor : El Magd Form : El Magd

**Submittal Category:**

<input type="checkbox"/> Architecture – (ARCH)	<input checked="" type="checkbox"/> Civil/Structure – (ST)	<input type="checkbox"/> Survey – (SURV)
<input type="checkbox"/> MEP – (MEP)	<input type="checkbox"/> Fire Protection – (FF)	<input type="checkbox"/> Plumbing – (PL)
<input type="checkbox"/> HVAC – (HVAC)	<input type="checkbox"/> Electrical – (ELECT)	<input type="checkbox"/> Low Current – (E-LC)
<input type="checkbox"/> Infrastructure – (INFRA)	<input type="checkbox"/> Mobilization – (MOB)	<input type="checkbox"/> Time Schedule – (T.SCH)
<input type="checkbox"/> Safety – (SAF)	<input type="checkbox"/> Organization Chart – (ORG)	<input type="checkbox"/> Roads (Hard Soft) Scape
<input type="checkbox"/> Elevators – (ELEV)	<input type="checkbox"/> General – (GEN)	

**Type of Submittal:**

<input type="checkbox"/> Product/Tech. Data	<input type="checkbox"/> Quantities Survey	<input type="checkbox"/> Certificates
<input type="checkbox"/> Procurement Plan	<input type="checkbox"/> Proposal	<input type="checkbox"/> Method Statement & ITP
<input type="checkbox"/> Others	<input checked="" type="checkbox"/> Reports	

**Subject :** Egyptian European Steel Fiber Company Profile

**Location:** Canopy

**Attachments:** Egyptian European Steel Fiber Company Profile

Hard Copy (21 A4 ) Sheets     Soft Copy (CD)

Contractor

**Note:** Please Clarify the Attachments if any.

**Action Code Legend:**

(A) Approved    (B) Approved as Noted    (C) Revise and Resubmit    (D) Rejected

**Notes :**

- Production, supply and /or implementation shall proceed only when action code is A / or B.
- Regarding action code C, resubmittal shall be within the limit set in the contract.
- Review dose not relieve the contractor from responsibility of compliance with all requirements of contract documents.
- if rejected please see comments.

**Consultant Comments:**

\* APPROVED FOR steel fiber 1.0/55 (EESF AFT Road Way).  
 \* steel fiber shall be added to APPROVED Mix design 30N/mm<sup>2</sup>  
 \* steel fiber dosage IS 30 Kg/m<sup>3</sup>.

Mohamed Abdel aln  
 Engineer

اسم المشروع :- مبنى طر فريدة جهاز مستقل مبنى  
المساحة / المرحلة :- عام  
رقم المبنى / الاسم :- مبنى طر فريدة جهاز مستقل مبنى

التاريخ القديم :- 2024-12-07  
القسم: (مستشاري)  
طلب اعتماد عينة رقم: EF-INT-ECB-MT-ST-0026

الاسم: الاستشاري: المهندس كونستانتين بوزو ECB  
من: المقاول: الشركة المسجلة لتسمية المقارنة والاستعداد المساهم "انجوريت"

رقم البند	رقم البند بالمقارنة	رقم البند بالموافقة	رقم البند بالطلب	وصف البند
1				Corrugated segment steel fibers(Steel Fiber) Instead of S.O.G Manufacture :- Egypton European Location:- Layout Under Roods
2				1-Data Sheet for Steel Fiber



التوقيع:

مدير المكتب الفني المقاول: م.م. شيماء احمد

جميع المستندات المقدمة بما فيها المواصفات والرسومات التفصيلية والكود  
للمراجع ومثبتة ورفيعة بدرجة عالية من الدقة كمواد معيارية البنية الاساسية  
- عند الحاجة الى اي تظليل او اي ملاحظات (ملاحظات) لتعديل المواصفات  
- مقارنتها الى مواصفات مصر 4534/1 راجع مواصفات البنية الاساسية ST 4534/1  
- والى مواصفات المواصفات المعمول بها في مصر والى المواصفات والمنهجيات العالمية

مكتب الاستشاري

RECEIVED  
2024-12-10  
11:00 AM  
Integrated

التقييم

مقبول

مقبول بملاحظات

بمادة التقييم



مرفوض

التوقيع:

مهندس الاستشاري

والناقص ومنك الترخيص صيغاً طبقاً لمتطلبات الكود المصري  
- مع رقم 4534/1 كدليل للمقارنة بالبريد الإلكتروني



SUBMITTAL OF SAMPLES تقديم عينات			SM No.:	1	
			Rev.:	0	
			Date:	04/12/2024	
Project: CAPITAL HEIGHTS 1		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>5 DEC 2024</b>  <b>RECEIVED</b> </div>			
Type:	Plot No.:				
Contract No.:					
TO RE: Eng.:		SUBMITTAL FOR: <input checked="" type="checkbox"/> Check			
		INFORMATION			
		APPROVAL <input checked="" type="checkbox"/>			
WE ARE SENDING HERewith / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW (DELETE AS NECESSARY)					
S.N.	QTY	DRWS, SPEC OR BOQ, REF.	DESCRIPTION	ATTACHMENT	
				NAME	NO
1			Request for approval of submittal material for steel fiber.	Data Sheet + Samples	
2					
3					
Contractor: PROJECT MANAGER NAME: Eng. SIGNATURE: DATE: CONSULTANT COMMENTS:					
					
Site/Technical Engineer: Name: Signature: Date:					
					
ACTION: <input checked="" type="checkbox"/> A Approved			<input checked="" type="checkbox"/> B Approved As Note		<input type="checkbox"/> C Not Approved (Resubmit)
Consultant: RESIDENT ENGINEER: Eng. SIGNATURE: DATE:			EMPLOYER: ALSAFWA URBAN DEVELOPMENT (SUO) PROJECT Director: Eng. SIGNATURE: DATE:		
TYPE	SM (samples) <input checked="" type="checkbox"/>	MD (Manufacture's data) <input type="checkbox"/>	CT (certificates) <input type="checkbox"/>	Time Schedule <input type="checkbox"/>	
	OT (other) <input type="checkbox"/>	PRE (Prequalification) <input type="checkbox"/>	Test Result <input type="checkbox"/>	Invoices <input type="checkbox"/>	



CAPITAL HEIGHTS




SAFWA URBAN DEVELOPMENT



ENGINEERING CONSULTING BUREAU  
HOUSE OF EXPERTISE



EGYPTIAN ENGINEERING SOCIETY FOR FIBERS

SUBMITTAL OF TEST RESULT				TEST NO.	1
				Rev.	0
				Date	04/12/2024
Project : CAPITAL HEIGHTS 1				<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">5 DEC 2024</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">RECEIVED</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Capital Heights</p> </div>	
Type _____ Plot No : _____					
Contract No. : _____					
TO RE- Eng _____				SUBMITTAL FOR: <input type="checkbox"/> CHECK	
				INFORMATION	
				APPROVAL	
WE ARE SENDING HEREWITH / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW (DELETE AS NECESSARY)				ATTACHMENT	
S.N.	QTY	DRWS, SPEC. OR BOQ REF.	DESCRIPTION	NAME	NO
1			Slab On Grade Design with steel fiber.		
2					
3					
Contractor: PROJECT MANAGER NAME: Eng. SIGNATURE: DATE: CONSULTANT COMMENTS:				 <p style="text-align: center;">             هذا التقرير              المقدم من قبل المهندس              محمد مصطفى / 3000              مهندس س.ف. 2024              والتأكد من أن              التصميم مطابق للمواصفات           </p>	
Site/Technical Engineer:					
Name:					
Signature:				A	
Date:				B	
ACTION				C	
				Not Approved (Resubmit)	
Consultant:				EMPLOYER: ALSAFWA URBAN DEVELOPMENT (SUD)	
RESIDENT ENGINEER:				PROJECT Director:	
Eng.				Eng.	
SIGNATURE:				SIGNATURE:	
DATE:				DATE:	
10/12/2024					
TYPE		SM (samples) <input type="checkbox"/>	MD (Manufacture's data) <input type="checkbox"/>	CT (certificates) <input type="checkbox"/>	Time Schedule <input type="checkbox"/>
		OT (other) <input type="checkbox"/>	PRE (Prequalification) <input type="checkbox"/>	Test Result <input checked="" type="checkbox"/>	Invoices <input type="checkbox"/>
Copy To PM					

٦/٢٠٢٨

١٤ هـ ص ٥٥٥



EGC  
EGYPTIAN AIRPORTS CO.  
EGYPTIAN AIRPORTS CO.  
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP SA



DAR AL ALAMIA  
CONSTRUCTION

مشروع مطار سانت كاترين الدولي

## Material Approval Submittal (MAS)

Activity	رقم البند بالمطابق	التاريخ	إصدار	طلب فحص رقم
STR	Buildings 18, 24 & 28	29/5/2023	00	SCA-DAR-ECG-MAS-STR-0038

منطقة البناء:

## Steel Fiber

رقم المنشأ	المصنع	المورد	الوصف	م
	Egyptian European Steel Fiber	Egyptian European Steel Fiber	Steel Fiber for Slab on Grade at Buildings 18, 24 & 28	1

Compliance sheet Catalog 33 (A4) المرفقات

اسم وتوقيع مهندس المطول المرفق:

مدير المكتب الفني

مهندس المكتب الفني



The calculation is approved

Mohamed Essai

Per int. Heba

31/5/2023

Contractor has to submit the design mix according to the approved calculation.

مرفوض (D)	تلقى الملاحظات وأعدا التقرير (C)	يتمد مع تلقي الملاحظات (B)	يتمد (A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التاريخ:

التوقيع:

مهندس الاستشاري:

ملاحظات أعضاء مهندس المكتب:

مرفوض (D)	تلقى الملاحظات وأعدا التقرير (C)	يتمد مع تلقي الملاحظات (B)	يتمد (A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التاريخ:

التوقيع:

مهندس المكتب:

استلام المطول	مهندس المكتب	الإستشاري العام للجهة المرفقة	الإسم:
			التوقيع:
			التاريخ:





**NEWGIZA**

**ECCG** *مجموعة شركات*  
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.



**ROWAD**  
Modern Engineering

**Submission for Approval**

Section: 033000	Date: 03/03/2022	<input checked="" type="checkbox"/> New Submittal	<input type="checkbox"/> Resubmittal
To: ECG New Giza University Hospital Project	From: Contractor: Rowad Modern Engineering (RME) Contract No.: 2666	Transmittal No.: NG-HPCH-MT-ST-036	Rev: 00
	Specification Sec No.: 033000	Items to be submitted:	
		<input type="checkbox"/> Shop Dwg.	<input type="checkbox"/> Samples
		<input type="checkbox"/> Certificates	<input type="checkbox"/> Colored Drawings
		<input type="checkbox"/> Method Statement	<input type="checkbox"/> Calculation Sheet
		<input type="checkbox"/> Others	<input checked="" type="checkbox"/> Open Data Sheet

ITEM	Description	No. of Copies	Contract Reference Documents		Action Code	NOTES
			Specs. No.	DWG No.		
1	Egyptian European Steel Fiber EESF® Xerox Corrugated Segment 0.7/50 Corrugated Steel fibers mixed with Concrete C25MPA, For Slab on Grade Company Profile, Prequalification, Data Sheet, tests, Steel Fiber Design	3	033000		B	Use same concrete mix design as material (submittal # NG-HPCH-MT-ST-0001-00 NGH.PRC.SUB.CW.01
<b>Consultant Remarks:</b>						
- Approved for steel fiber 0.7/50 according to attached data sheet, certificates and test results						
- Steel fiber should added to approved mix design 25 N/mm2						
- Steel fiber dosage is 25kg/m3 and should be added according to attached steel fiber design						
<b>ECG Remarks:</b>						
The Following Action Code Are Given to Item Submitted:						
A <input type="checkbox"/> Approved as Submitted						
B <input checked="" type="checkbox"/> Approved as Noted						
C <input type="checkbox"/> Revise & Resubmission Required.						
<b>ECG: Author:</b> .....						
<b>ECG Project Manager:</b> .....						



Approval of Item Does not Relieve the Contractor from complying with requirements of Contract documents Specifications and applicable Codes.

Contractor Name: **Ahmed Halaawy**

Contractor Signature: *[Signature]*

It's not intended by the aforementioned responses to constitute Engineer's instruction for variation. In case the Contractor believes that this reply induces variation proposed by Contractor, Contractor shall immediately notify the Engineer with the time & cost implications, if any





المطلوب العام: شركة الصلوة للمقاولات	الاستشاري: مكتب زهران للاستشارات الهندسية والتصميمات	الشركة العربية للعبوات الدوائية فلكسبيك
		

ARCH/MAT/68	طلب اعتماد بيانات فنية	تاريخ إعداد الطلب
Rev.		14/05/2023

ملاحظات

- طبقاً لطلب التعاقد والبيانات الفنية المرفقة للشركة المصرية الدوائية المتخصصة في توفير وحيد العزسان المسلحة فائقة الجودة (Steel Fiber Concr) تم اعتماد الشركة المصرية الدوائية لتنفيذ الارضيات العزسانية للطرق والحمامات بحد رقم (٢) معايمة الطرق وبنفس سعر البند الوارد بالمقايمة .
- على أن يتم التنفيذ طبقاً للاشتراطات الآتية :-
- سمك البلاطة العزسانية ٢٠ سم
- العزسان المستخدمة اجسام ٣٠٠ كجم /م<sup>٣</sup> وحتوى اسنتي ٤٠ كجم /م<sup>٣</sup> ومسلحة بالبياف الاستيل فايبر بمعدل ٣٠ كجم / م<sup>٣</sup>
- اضافة مادة مصلدة للمسطح ( Dry shake Harding ) بمعدل ١٠ - ٥ كجم /م<sup>٢</sup>
- اضافة مادة معالجة للعزسان لسد المسام ومنع النفاذية بعد الصب لمسطح العزسان ( Curing Agent Sealant )
- وضع طبقة من البولي ايثيلين شيفت أسفل العزسان بسمك لا يقل عن ١٥٠ مايكرون
- البند يشمل تقطيع الفواصل الخاصة بالانكماش بالمتساوي والكرومات ومدها بمادة مائنة ممتدة
- تشطيب المسطح وتوزيع المادة المصلدة وتوزيع البياف الاستيل فايبر يتم ميكانيكياً وباستخدام الالات والمعدات المعصمة لذلك

عمل الربط اللازم لمسطح العزسان الارضى مع البلاطات العزسانية فوقاً بالفاير رابيه ٣٠٠ / م مع عمل شبكة حديد ١٤ Φ ٥ في الاعمدة والقوائم حول الفتحات . وكذلك عمل شبكة حديد

- تقديم البيانات الخاصة بالبياف الاستيل فايبر والمادة المصلدة ومادة المعالجة السائلة ومادة ملاء الفواصل للاعتماد قبل التنفيذ

م/ عبده دحمان الربيع  
١٦ / ٥ / ٢٣  
٣ / عمرو هلال  
٥٧ / ٥ / ٢٣

PIONEERS IN  
**FIBER**  
REINFORCED  
CONCRETE

# STEEL FIBER TESTS

نتائج اختبار الإحناء على خلطات خرسانية محددة النسب

تاريخ التوريد : ٢٠٢٤/٠٨/٢٢  
رقم الوارد : I/1602/2024  
تاريخ الصب : ٢٠٢٤/٩/٣

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار :  
الجهة طالبة الاختبار : مكتب استشاري د/ ايمن حسين  
المشروع : \_\_\_\_\_

بيانات إضافية: الجهة العالقة : العربي جروب  
الجهة المنفذة : المصرية الأوروبية لتصنيع الاسفلت فايبر  
الأكياس المستخدمة بالخلطة : EESF® Xorex Corrugated Segment Steel 0.7/50  
العينات : كمرات مقل ١٠×١٠×٥٠ سم

مكونات الخلطات الخرسانية المطلوبة

الخلطة	المكونات كجم/م <sup>٣</sup>				
	أسمنت	سن ٠,٥	رمل	ماء	ألياف معدنية
خلطة التحكم	٣٧٥	١١٢٠	٧٤٠	٢٤٠	-----
خلطة رقم (١)	٣٧٥	١١٢٠	٧٤٠	٢٤٠	٢٥

النتائج :

نتائج اختبارات الخرسانة الطازجة

الخلطة	خواص الخلطة	
	الهبوط (سم)	محتوي الهواء المحبوس (%)
خلطة التحكم	١٨,٠	٢,٢
خلطة رقم (١)	١٧,٠	٢,٤

نتائج اختبار الإحناء

١. خلطة التحكم (بدون ألياف معدنية):

أرقام العينات	حمل الكسر (كن)	مقاومة الإحناء (نيوتن/م <sup>٢</sup> )	مقاومة الإحناء (كجم/م <sup>٢</sup> )	تاريخ الصب	تاريخ التكسير
١	١٤,٢	٥,٧	٥٧	٢٠٢٤/٩/٣	٢٠٢٤/٩/٣
٢	١٤,٧	٥,٩	٥٩		
٣	١٤,٥	٥,٨	٥٨		

HBRC Logo

دكتور

م. أحمد

صفحة ١ من ٢

٢. خلطة رقم (١) باستخدام الزئاف معدنية بمحتوى ٢٥ كجم/م<sup>٣</sup>:

أرقام العينات	حمل الكسر (كغ)	مقاومة الإنحناء (نيوتن/مم <sup>٢</sup> )	مقاومة الإنحناء (كجم/سم <sup>٢</sup> )	تاريخ الصب	تاريخ التكسير
١	١٥,٥	٦,٢	٦٢	٢٠٢٤/٩/٣	٢٠٢٤/٩/١٠
٢	١٧,٠	٦,٨	٦٨		
٣	١٦,٢	٦,٥	٦٥		

ملاحظات:

- النتائج الموضحة عاليه تسري فقط علي العينات المقدمة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات الموضحة بعالية طبقا لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار.
- تم تحميل العينات بحملين عند ثلثي الكمرة.
- يتم تحديد حدود القبول أو الرفض طبقا لمواصفات المشروع .
- تم تحديد مكونات الخلطة الخرسانية بواسطة الجهة طالبة الاختبار.
- سوف يتم موافاتكم بنتائج عمر ٢٨ يوم فور صدورها.
- مدة سريان التقرير ٣ شهور من تاريخ الاصدار.

المشرف العام



المشرف

د. ش. ش. ش.  
٤٠٤٩١٩

إعداد التقرير

إ. ع. ع. ع.



جامعة القاهرة  
Cairo University

معمل اختبار المواد

Materials Testing Lab



كلية الهندسة  
Faculty of Engineering

Your Ref. Date 17/03/2024

Lab. Ref. No. : MTL/591-1/2024

Date : 20/03/2024

Applicant :

الشرطة المصرية اوروبية التفتيش الامن للملح  
مشرقة لارضية ملحن شركة لاسفة

Specimens :

عدد 2 مكعبات خرسانية موزونة بمعرفة المعمل

" Results Of Compression Test "

Cube No.	Weight (kg)	Dimensions			Loaded Area (cm <sup>2</sup> )	Crushing		Casting Date	Testing Date	Remarks
		L. cm	W. cm	d. cm		Load (kg)	Strength (kg/cm <sup>2</sup> )			
1	8.285	15.0	15.0	15.0	225.0	62140	276.2	06/03/2024	20/03/2024	خرسنة مسطحة بظلال لم تستقل للملح / 2024 م
2	8.320	15.0	15.0	15.0	225.0	72520	322.3			

Dr. Hisham Hassan Al-Torabchi  
LABORATORY

Materials Testing Lab.

Cairo University - Faculty of Engineering, Materials Testing Lab,  
Giza - Egypt Zip Code:12316 Tel:(202)35678094 - Fax:(202)35694392

كلية القاهرة - كلية الهندسة - معمل اختبار المواد - مبنى الملح - جناح - رقم المبنى ١٢٣١٦  
مقرية مصر الغربية ص.ب. ١٢٣١٦ - مصر (٢٠٢٢) ٣٥٦٧٨٠٤٤٤٤ - مصر الغربية ص.ب. ١٢٣١٦ (٢٠٢٢) ٣٥٦٩٤٣٩٢

مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي  
الإدارة العامة لاختبار المنتجات الكيميائية ومواد التشبيد

تقرير نتائج اختبار عينة "ستيل فايبر"  
EOS C2/3-1

٢٠٢٥/٦/١٧	: تاريخ دخول العينة	المصرية الأوربية لتصنيع الأستيل فايبر	: الجهة الوارد منها العينة
مواد البناء	المعمل المختص	عينة ستيل فايبر End Hook Steel Fibers 1/50	: العينة المقدمة
١	: عدد صفحات التقرير	ك / م / ٢١٤٥٦ / ٢٠٢٥/٦	: الرقم كودي / المسري
٢٠٢٥/٧/٢١	: تاريخ إصدار التقرير	إجراء اجراء الاختبارات طبقاً ASTM-A820	: متطلبات العنيل

تم إجراء الاختبارات على العينة المقدمة بمعرفتم طبقاً ASTM-A820 وكانت نتائج الاختبارات كالتالي:-

النتيجة	الاختبار
١	١- القطر (مم)
٥٠	٢- الطول (مم)
٥٢٨,٥	٣- مقاومة الشد (ميغا باسكال)
١٠٥٧	٤- أقصى حمل للشد (نيوتن)
٥,١٨	٥- الاستطالة (%)

هذا وتجدر الإشارة ان نتائج اختبار هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعنى بها لاعتماد النتائج كمنى او فى الممارسات او التوريدات او التصدير ولا يعنى بها كشهادة مطابقة

عبد الرحمن العبدان  
مدير المختبر  
٧/٢١

المدير العام

عبد الرحمن العبدان  
(ك / هشام مصطفى محمد)



هيئة المصرية العامة  
للمواصفات والجودة  
تاريخ: ٨ / ١١ / ٢٠٢٥  
أ. م. الصادق / ٢٢٤٥٦ / مرجحات



مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي  
الإدارة العامة لاختبار المنتجات الكيماوية ومواد التشييد

تقرير نتائج اختبار عينة "ستيل فايبر"

EOS C2/3-1

الجهة الوارد منها العينة :	المصرية الأوربية لتصنيع الأسفلت فايبر	تاريخ دخول العينة :	٢٠٢٥/٦/١٧
العينة المقدمة :	عينة ستيل فايبر Round Wavy Steel Fibers 1/55	المعمل المختص	مواد البناء
الرقم كودي / المسري :	ك / م / ٢١٤٥٨ / ٢٠٢٥/٦	عدد صفحات التقرير :	١
متطلبات المعيار :	إجراء اجراء الاختبارات طبقاً ASTM-A820	تاريخ إصدار التقرير :	٢٠٢٥/٧/٢١

تم إجراء الاختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقاً ASTM-A820 وكانت نتائج الاختبارات كالتالي:-

النتيجة	الاختبار
١	١- القطر (مم)
٥٠	٢- الطول (مم)
٦٠٥	٣- مقاومة الشد (ميغا باسكال)
١٢١٠	٤- أقصى حمل للشد (نيوتن)
٤.٢٧	٥- الاستطالة (%)


هذا وتجدر الإشارة ان نتائج اختبار هذه العينة لا تمثل الا نفسها ولا يعنى بها لاعتماد النتائج كمن أو في الممارسات أو التوريدات أو التصدير ولا يعنى بها كشهادة مطابقة

فدري الزاد  
استاذ  
٧/٢١

المدير العام

محمد مصطفى محمد

(ك / هشام مصطفى محمد)





المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

نتائج اختبار الضغط على خلطات خرسانية محددة النسب

تاريخ التوريد : ٢٠٢٠/١١/٢٦

رقم الوارد : ٦٨٧٧

الجهة الموردة : المصرية الأوروبية لتصنيع الاستل فاير

المشروع : .....

بيانات إضافية: EESF® Xorex Corrugated Segment Steel Fibre 0.7/50

"مكونات الخلطات الخرسانية المطلوبة"

البيانات معنوية	المكونات كجم/م <sup>3</sup>				الخلطة بالوزن (كجم)
	ماء	رمل	سن ١	اسمنت	
-----	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة التحكم
١٥	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة رقم (١)
٢٠	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة رقم (٢)
٣٠	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة رقم (٣)

نتائج اختبار الضغط

١- خلطة التحكم (بدون ألياف معنوية):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			سطح التحميل (م <sup>2</sup> )	حمل الكسر (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )	متوسط مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )
		ارتفاع	عرض	طول				
٢٦٩	٢٨ يوم	١٥,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	٦١,٠	٢٧١	٢٦٩
		١٥,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٢٠	٢٢٨,٠٠	٦١,٧	٢٧١	
		١٥,٠٠	١٥,٠٠	١٥,١٠	٢٢٦,٥٠	٦٠,١	٢٦٥	

٢- خلطة رقم (١) (باستخدام ألياف معنوية بمحتوى ١٥ كجم/م<sup>3</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			سطح التحميل (م <sup>2</sup> )	حمل الكسر (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )	متوسط مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )
		ارتفاع	عرض	طول				
٢٩٤	٢٨ يوم	١٥,١٠	١٥,١٠	١٥,١٠	٢٢٨,٠١	٦٨,٩	٣٠٢	٢٩٤
		١٥,٠٠	١٥,١٠	١٥,٢٠	٢٢٨,٠٠	٦٨,٩	٢٨٢	
		١٥,٠٠	١٥,١٠	١٥,١٠	٢٢٨,٠٠	٦٧,٧	٢٩٧	

د. البرهان  
١٥/١١/٢٠٢٠

علاء الدين  
عزت  
صفحة ١ من ٢  
٢٠٢٠/١١/٢٦



نتائج اختبار الإحناء على خلطات خرسانية محددة النسب

تاريخ التوريد : ٢٠٢٠/١١/٢٦  
رقم الوارد : ٦٨٧٧

الجهة الموردة : المصرية الأوروبية لتسليح الاستيل فايبر

المشروع : -----

بيانات إضافية: EESF® Xorex Corrugated Segment Steel Fibre 0.7/50

"مكونات الخلطات الخرسانية المطلوبة"

الخلطة بأوزن ( كجم )	المكونات كجم/م <sup>3</sup>			
	أسمنت	س ١	رمل	ماء
خلطة التحكم	٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧
خلطة رقم (١)	٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧
خلطة رقم (٢)	٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧
خلطة رقم (٣)	٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧

نتائج اختبار الإحناء

١. خلطة التحكم (بدون ألياف معدنية):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			بحر التحميل (سم)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الإحناء (كجم/سم <sup>2</sup> )
		طول	عرض	ارتفاع			
١	٢٨ يوم	٥٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٤٠,٠	٠,٧٥٥	٥٦,٦٣

٢. خلطة رقم (١) (باستخدام ألياف معدنية بمحتوى ١٥ كجم/م<sup>3</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			بحر التحميل (سم)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الإحناء (كجم/سم <sup>2</sup> )
		طول	عرض	ارتفاع			
١	٢٨ يوم	٥٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٤٠,٠	٠,٧٥٥	٦٣,٩٠

أ. م. م. م.



أ. م. م. م.  
٠.٩١ / ٠.١٣

أ. م. م. م.  
٠.٩١ / ٠.١٣

نتائج اختبار الإحناء على خلطات خرسانية محددة النسب

تاريخ التوريد : ٢٠٢٠/١١/٢٦

رقم الوارد : ٦٨٧٧

الجهة الموردة : المصرية الأوروبية لتصنيع الاستيل فاير

المشروع : -----

بيانات إضافية: EESF® Xorex Corrugated Segment Steel Fibre 0.7/50

"مكونات الخلطات الخرسانية المطلوبة"

التياف معدنية	المكونات كجم/م <sup>3</sup>				الخلطة بالتوزن (كجم)
	ماء	رمل	سن ١	اسمنت	
-----	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة التحكم
١٥	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة رقم (١)
٢٠	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة رقم (٢)
٣٠	٢٢٧	٥٦٠	١٢٨٠	٣٥٠	خلطة رقم (٣)

نتائج اختبار الإحناء

١. خلطة التحكم (بدون ألياف معدنية):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			بحر التحميل (سم)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الإحناء (كجم/سم <sup>2</sup> )
		طول	عرض	ارتفاع			
١	٢٨ يوم	٥٠٠	١٠٠	١٠٠	٤٠٠	١٠,٧٥٥	٥٦,٦٣

٢. خلطة رقم (١) (باستخدام ألياف معدنية بمحتوى ١٥ كجم/م<sup>3</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			بحر التحميل (سم)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الإحناء (كجم/سم <sup>2</sup> )
		طول	عرض	ارتفاع			
١	٢٨ يوم	٥٠٠	١٠٠	١٠٠	٤٠٠	١٠,٧٥٥	٦٣,٩٠

Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp with "BMI" and "QUALITY CONTROL INSTITUTE BUILDING MATERIALS" text.

Handwritten notes and signatures in Arabic.

صفحة ١ من ٢

٣. خلطة رقم (٢) (باستخدام ألياف معننية بمحتوى ٢٠ كجم/م<sup>٣</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			بحر التحميل (سم)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الإثناء (كجم/سم <sup>٢</sup> )
		طول	عرض	ارتفاع			
١	٢٨ يوم	٥٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٩٠٥	٦٧,٨٨

٤. خلطة رقم (٣) (باستخدام ألياف معننية بمحتوى ٣٠ كجم/م<sup>٣</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)			بحر التحميل (سم)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الإثناء (كجم/سم <sup>٢</sup> )
		طول	عرض	ارتفاع			
١	٢٨ يوم	٥٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٤٠,٠٠	١,٠٩٥	٨٢,١٣

ملاحظات :

- النتائج الموضحة عاليه تسري فقط علي العينات المقدمة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات الموضحة بعالية طبقاً لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار.
- يتم تحديد حدود القبول أو الرفض طبقاً لمواصفات المشروع .
- تم تحديد مكونات الخلطة الخرسانية بواسطة الجهة طالبة الاختبار.

المشرف العام  
د/علاء / شحات

المشرف  
د/علاء / شحات

إعداد التقرير  
د/علاء / شحات  
علاء / شحات  
٢٠١٩/٠٩





المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

معهد بحوث مواد البناء وشبكات الجودة

نتائج اختبار شد غير المباشر على عينات اسطوانية ( خلطات خرسانية محددة النسب )

الجهة الموردة : المصرية الاوروبية لتصنيع الاسفلت فاير

المشروع : -----

بيانات إضافية: EESF® Xorex Corrugated Segment Steel Fibre 0.7/50

تاريخ التوريد : ٢٠٢٠/١١/٢٦

رقم الوارد : ٦٨٧٧

"مكونات الخلطات الخرسانية المطلوبة"

المكونات كجم/م <sup>٣</sup>					الخلطة بالوزن (كجم)
أسمنت	س ١	رمل	ماء	ألياف معنبة	
٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧	-----	خلطة التحكم
٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧	١٥	خلطة رقم (١)
٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧	٢٠	خلطة رقم (٢)
٣٥٠	١٢٨٠	٥٦٠	٢٢٧	٣٠	خلطة رقم (٣)

نتائج اختبار الشد غير المباشر :

١- خلطة التحكم (بدون ألياف معنبة):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)		مساحة (م <sup>٢</sup> )	حمل الكسر (كجم)	مقاومة الشد (كجم/م <sup>٢</sup> )
		الارتفاع	القطر			
١	٢٨ يوم	٣٠	١٥	١٧٦,٦٣	١٥٤٧٠	٢١,٩٠

٢- خلطة رقم (١) (باستخدام ألياف معنبة بمحتوى ١٥ كجم/م<sup>٣</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)		مساحة (م <sup>٢</sup> )	حمل الكسر (كجم)	مقاومة الشد (كجم/م <sup>٢</sup> )
		الارتفاع	القطر			
١	٢٨ يوم	٣٠	١٥	١٧٦,٦٣	١٦٥٥٠	٢٢,٤٣



ع/إيهاب درويش  
٢٠٢١/٠١/٠٢

عندم اغاوة كرم  
٢٠٢١/٠١/٠٢

صفحة ١ من ٢



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

٣- خلطة رقم (٢) (باستخدام ألياف معدنية بمحتوى ٢٠ كجم/م<sup>٣</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)		المساحة (م <sup>٢</sup> )	حمل الكسر (كجم)	مقاومة الشد (كجم/سم <sup>٢</sup> )
		القطر	الارتفاع			
١	٢٨ يوم	١٥	٣٠	١٧٦,٦٣	١٦٣٢٠	٢٣,١٠

٤- خلطة رقم (٣) (باستخدام ألياف معدنية بمحتوى ٣٠ كجم/م<sup>٣</sup>):

رقم	عمر الخرسانة	مقاسات (سم)		المساحة (م <sup>٢</sup> )	حمل الكسر (كجم)	مقاومة الشد (كجم/سم <sup>٢</sup> )
		القطر	الارتفاع			
١	٢٨ يوم	١٥	٣٠	١٧٦,٦٣	١٩٢٧٠	٢٧,٢٨

ملاحظات:

- التفتيح الموضحة عليه تسري فقط على العينات المقدمة من الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات الموضحة بعالية طبقا لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار.
- يتم تحديد حدود القبول أو الرفض طبقا لمواصفات المشروع.
- تم تحديد مكونات الخلطة الخرسانية بواسطة الجهة طالبة الاختبار.

المشرف العام

د/غادة

المشرف

د/محمد

إعداد التقرير

د/محمد  
د/غادة  
٢٠١١/١١/٢٨



صفحة ٢ من ٢



Links you may need  
to check out



**Website**



**Linkedin Account**



**Facebook Page**



**YouTube Channel**

 **Office:** Villa 306 - El-Yasmen (6) 1st Settlement New Cairo -  
Cairo – Egypt.

 **Factory:** 10th Of Ramadan Industrial Area A6 - Cairo – Egypt.

 **Phone:** (+2) 022 306 2306

 **Mobile:** (+2) 0100 5700 531  
(+966) 564 893 298

 **Email:** info@eesf-fiber.com
